

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 17/04/2025

Inspecteur: Danny Verstraete

Mentor:

Installateur: BMS electro

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0671 744 596

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155 Serienummer: 24030338

Datum verslag: 17/04/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Langstraat
Huisnummer 93
Busnummer
Postcode 3650
Gemeente Elen
Land België

Eigenaar

Naam Mirthe vanholsaet
Straatnaam Langstraat
Huisnummer 93
Busnummer
Postcode 3650
Gemeente Elen
Land België

Installateur

Naam BMS electro
BTW nr. BE 0671 744 596
Telefoonnummer +32 477 38 37 90
E-mail Info@bmselectro.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541449206003972587

Teller Nr.: : 1SAG3100246605



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 3

Aardelektrode: Combinatie: aardingslus + Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A

Aantal kringen: 20

Ri algemeen: 2.40 MΩ

RE: 21 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	20	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	2	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	9	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	9	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 17/4/2050
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 07:56 tot 08:32
De inspecteur Danny Verstraete


Danny Verstraete
ACEG VZW - #362

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 17/4/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



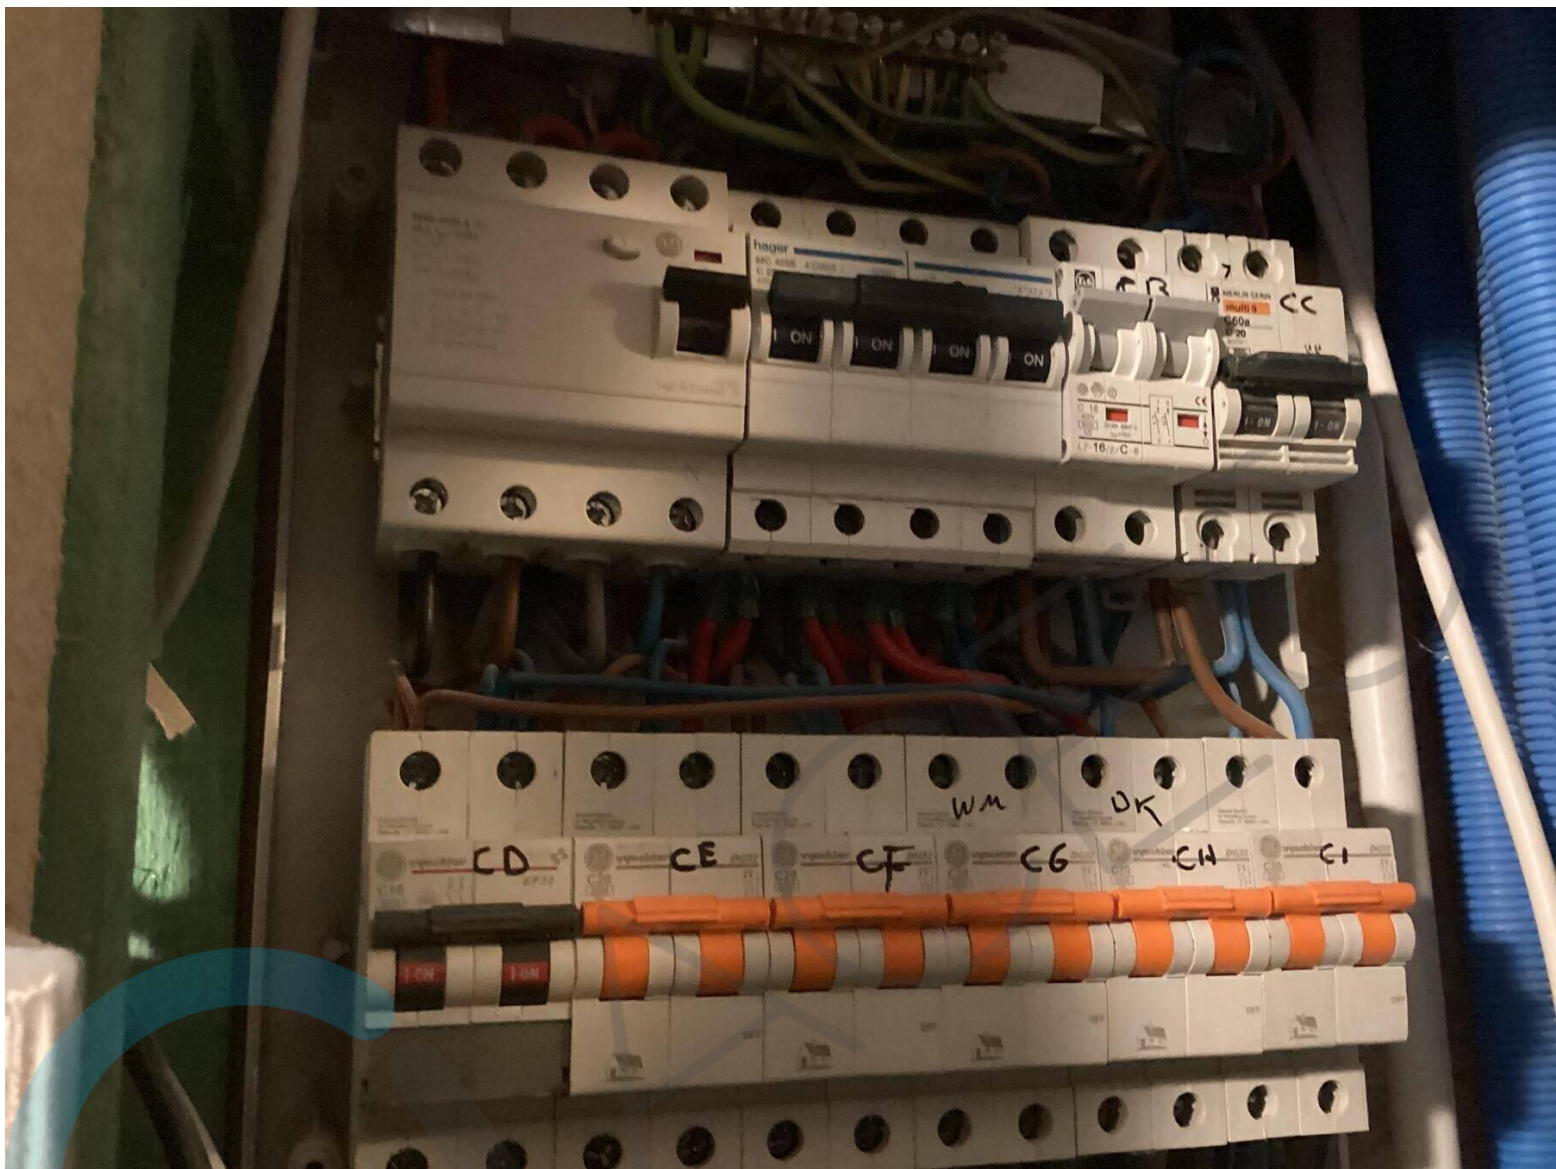













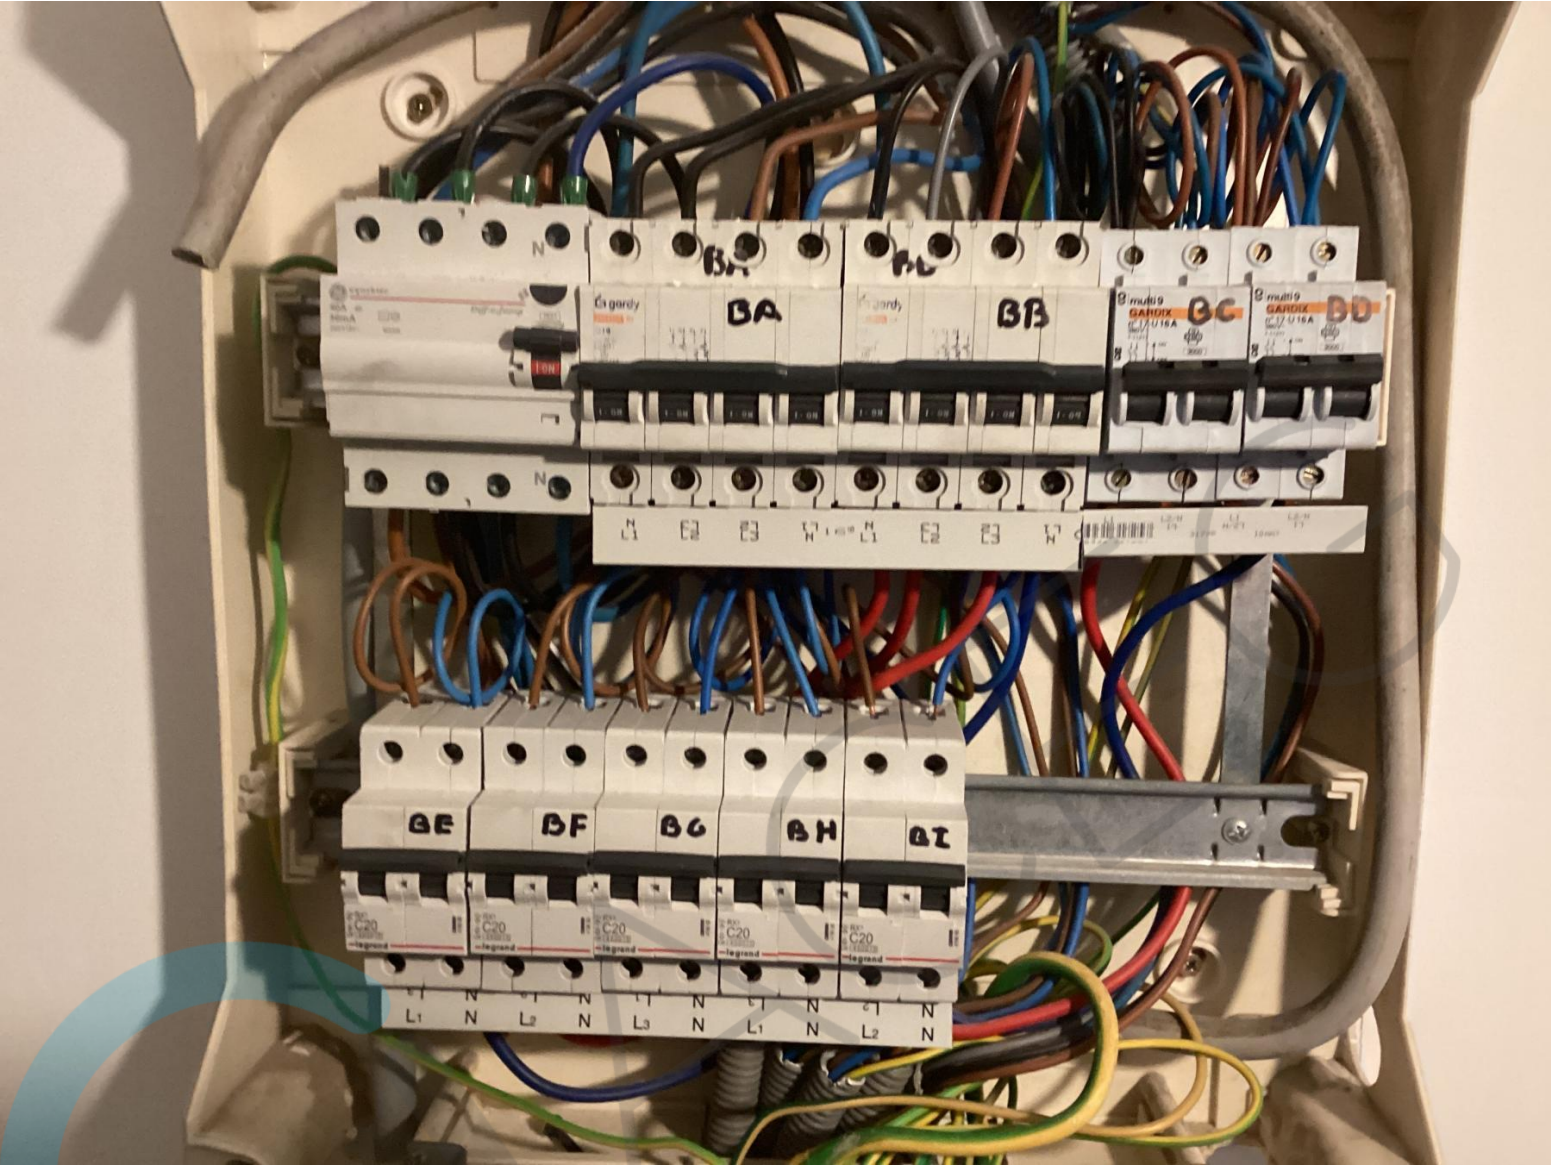


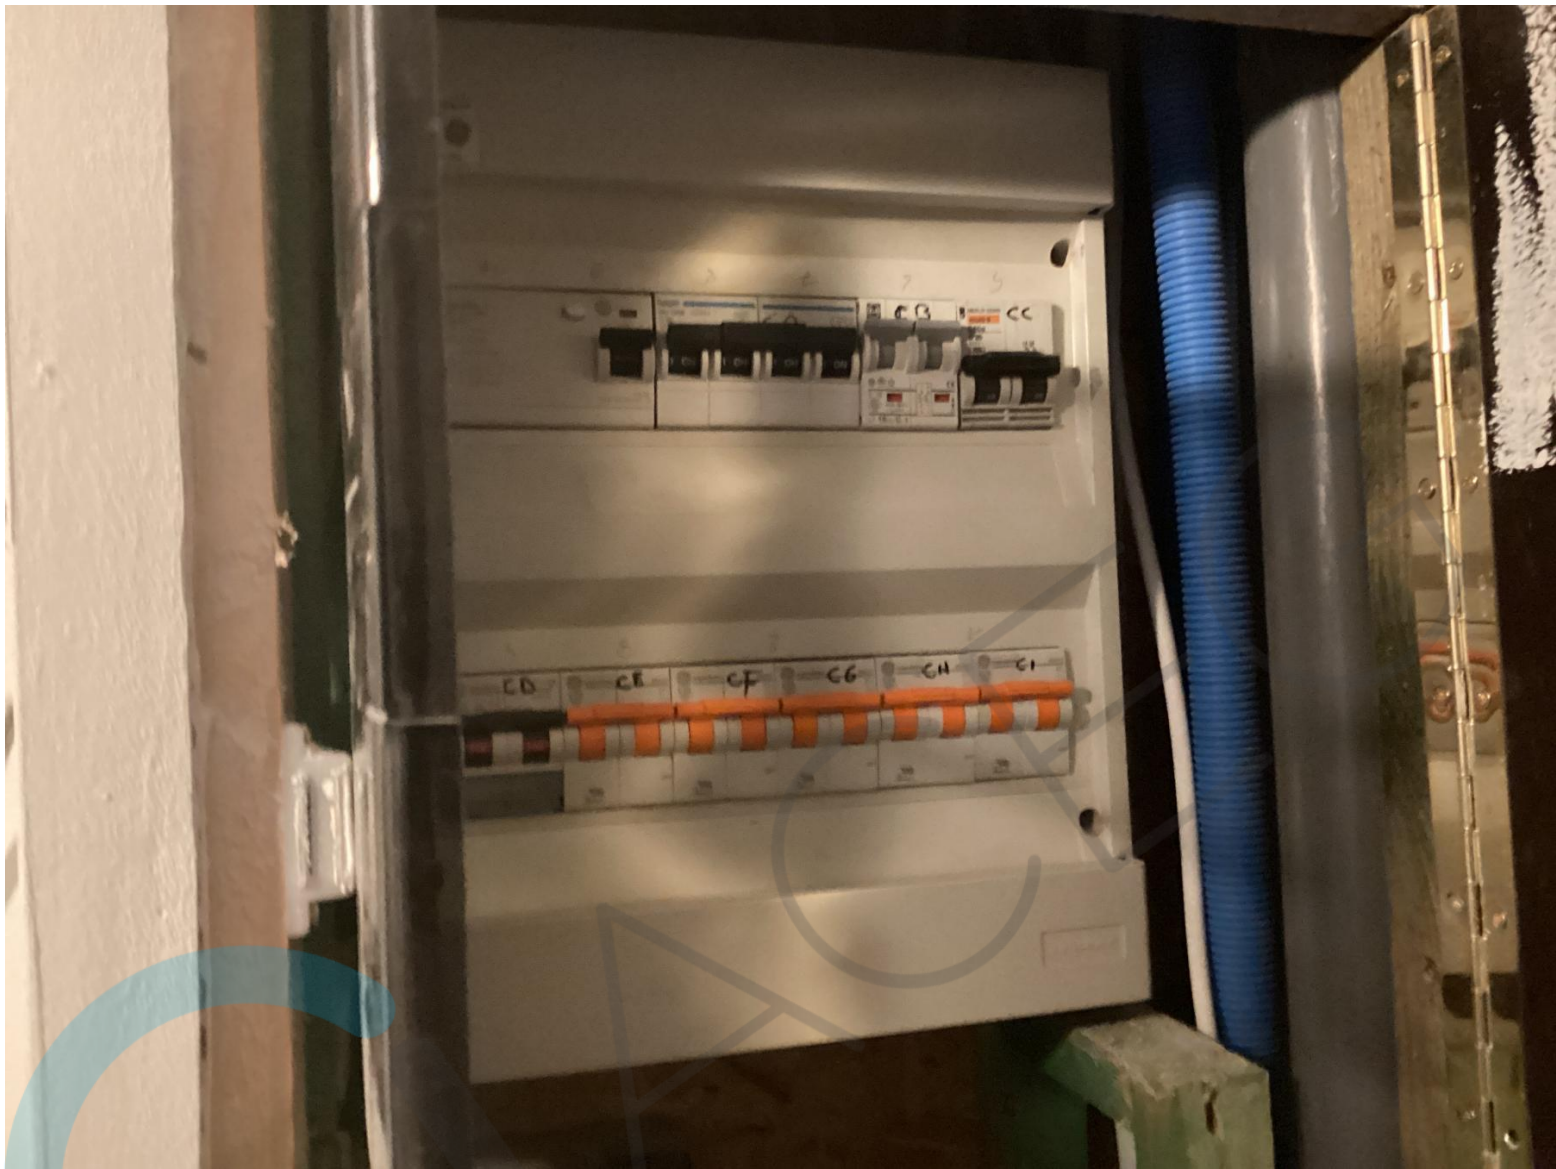

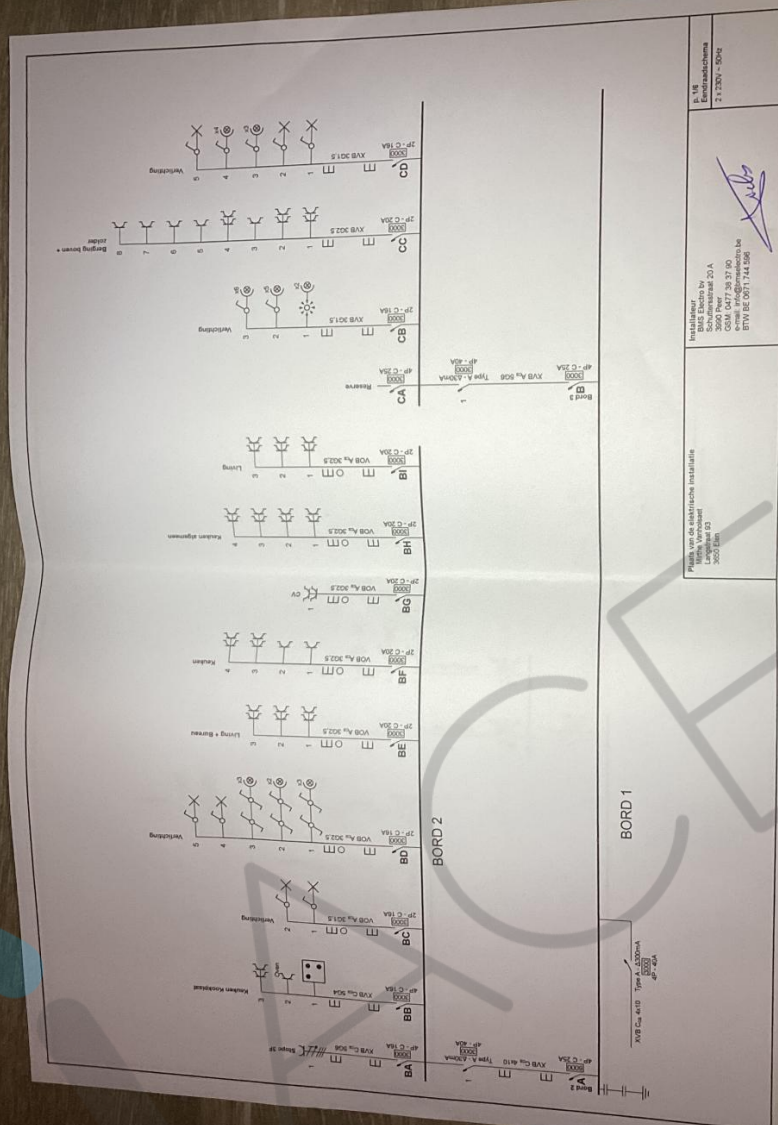


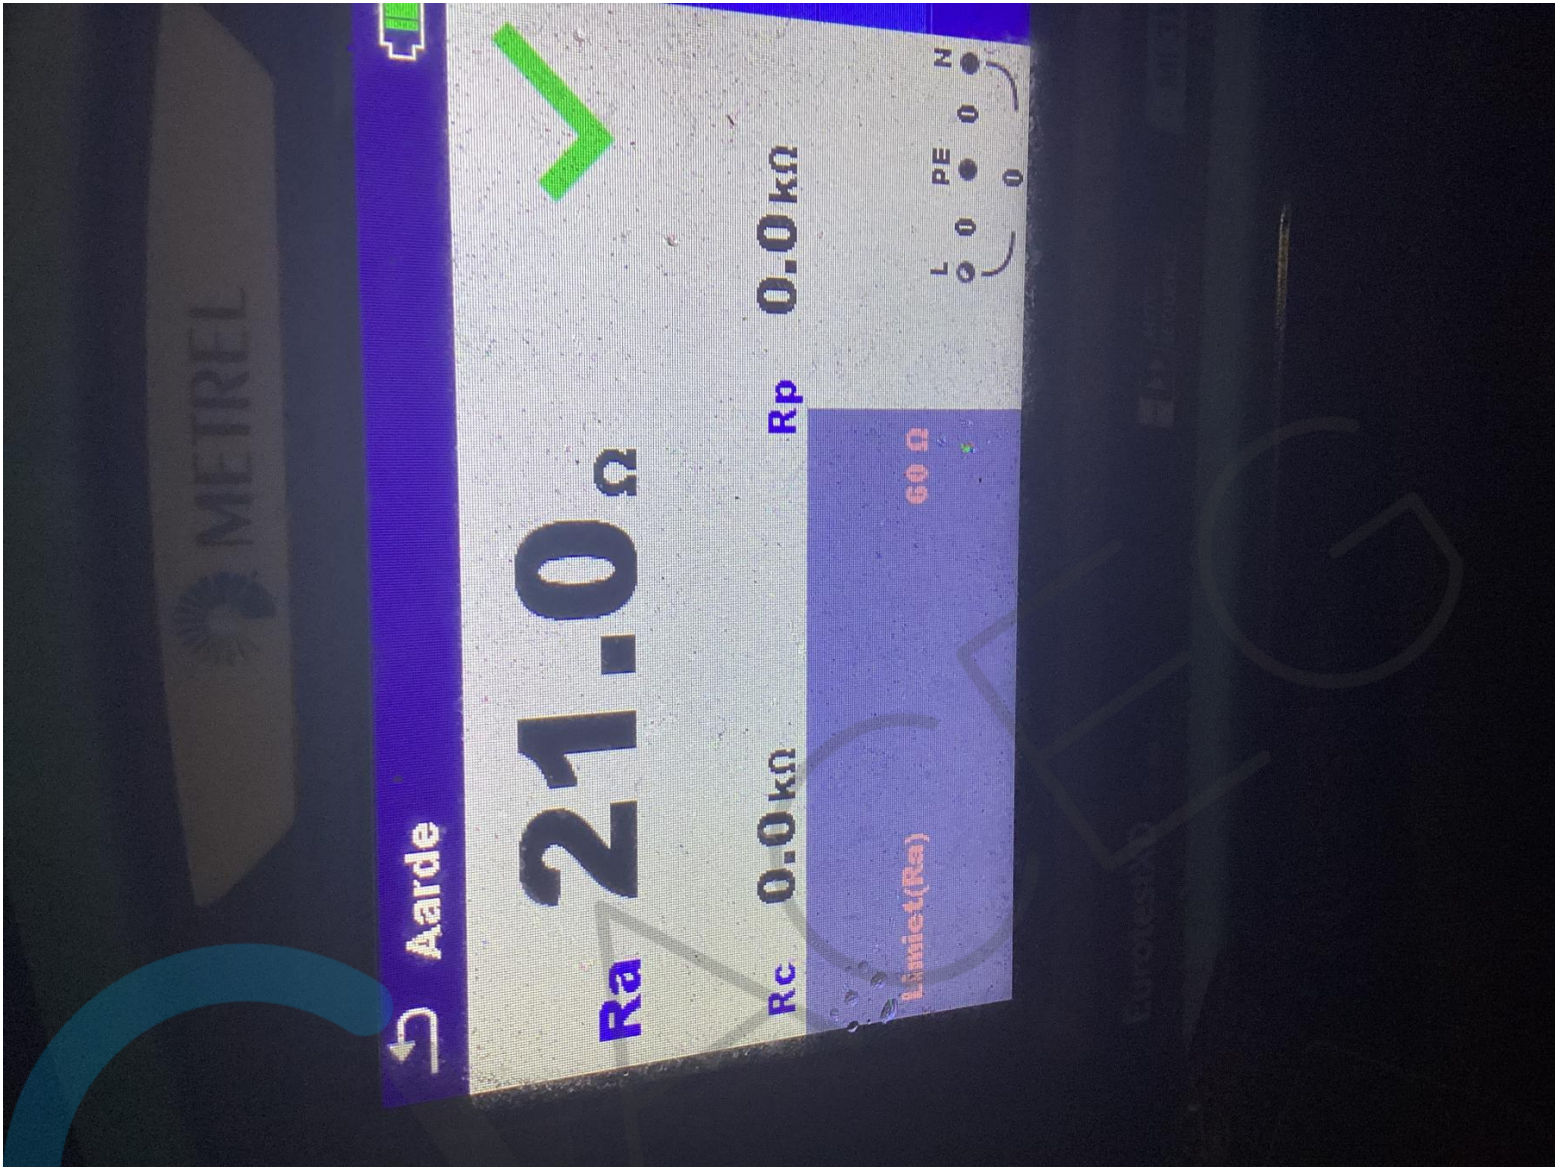




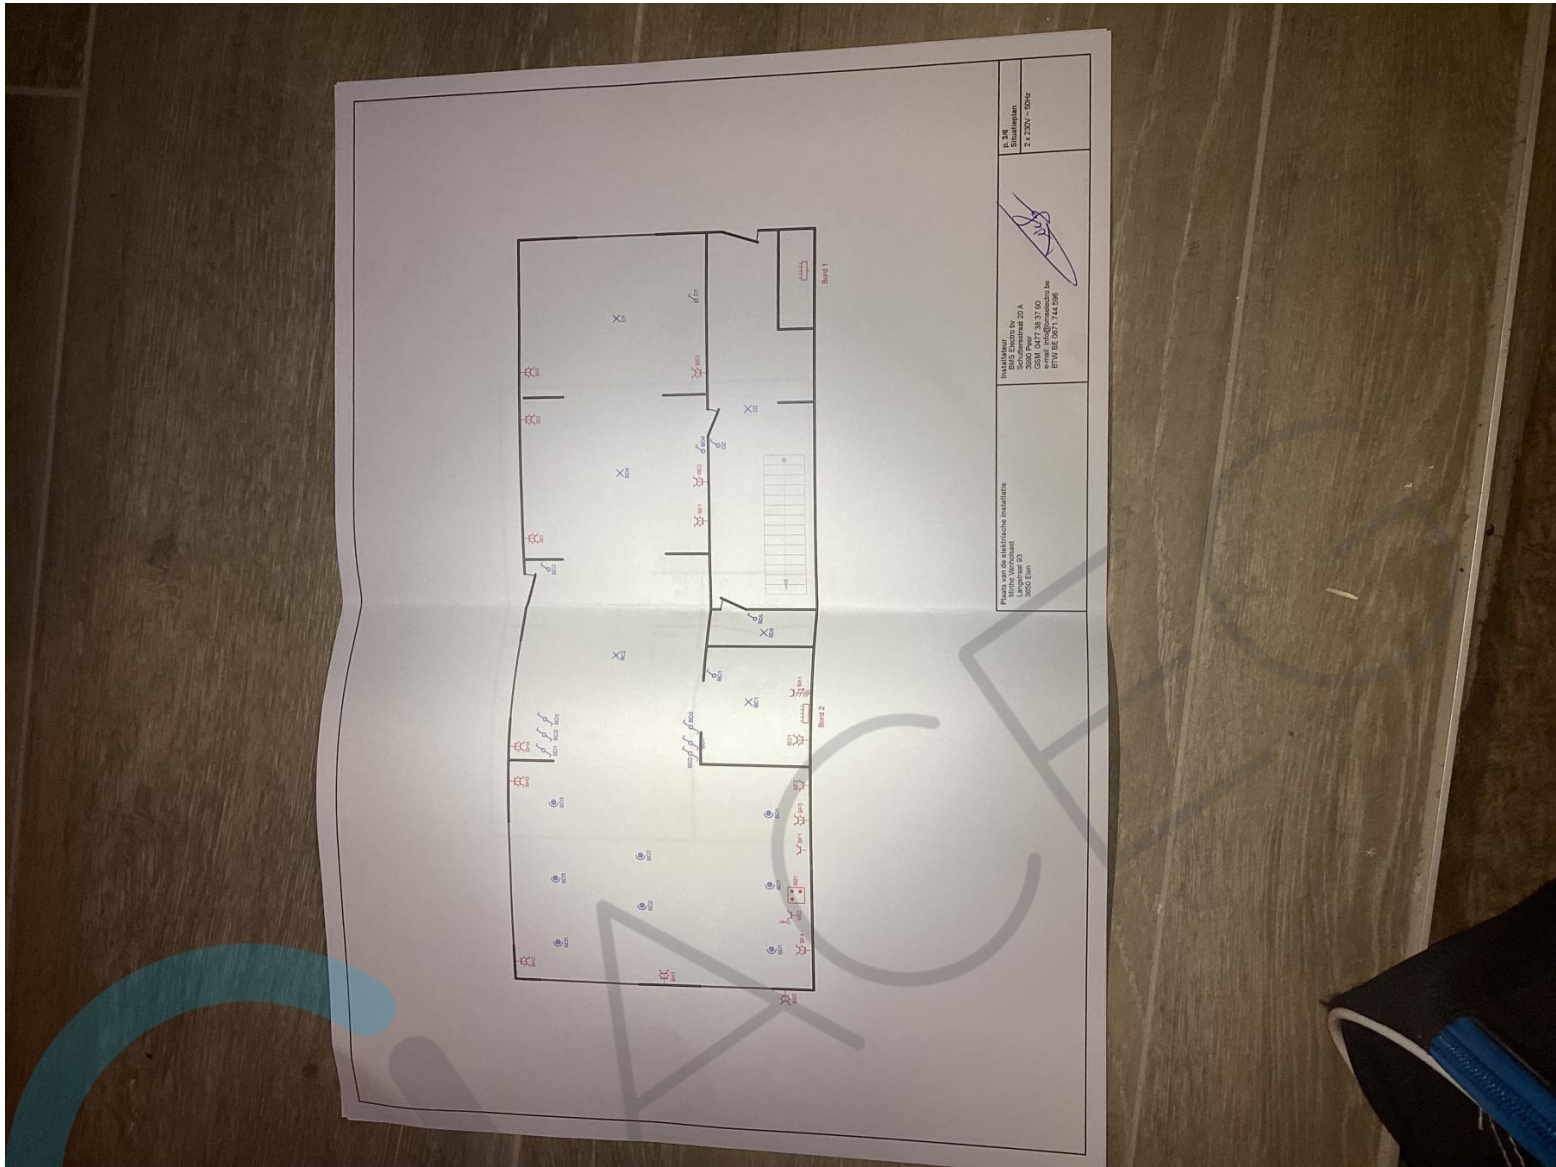



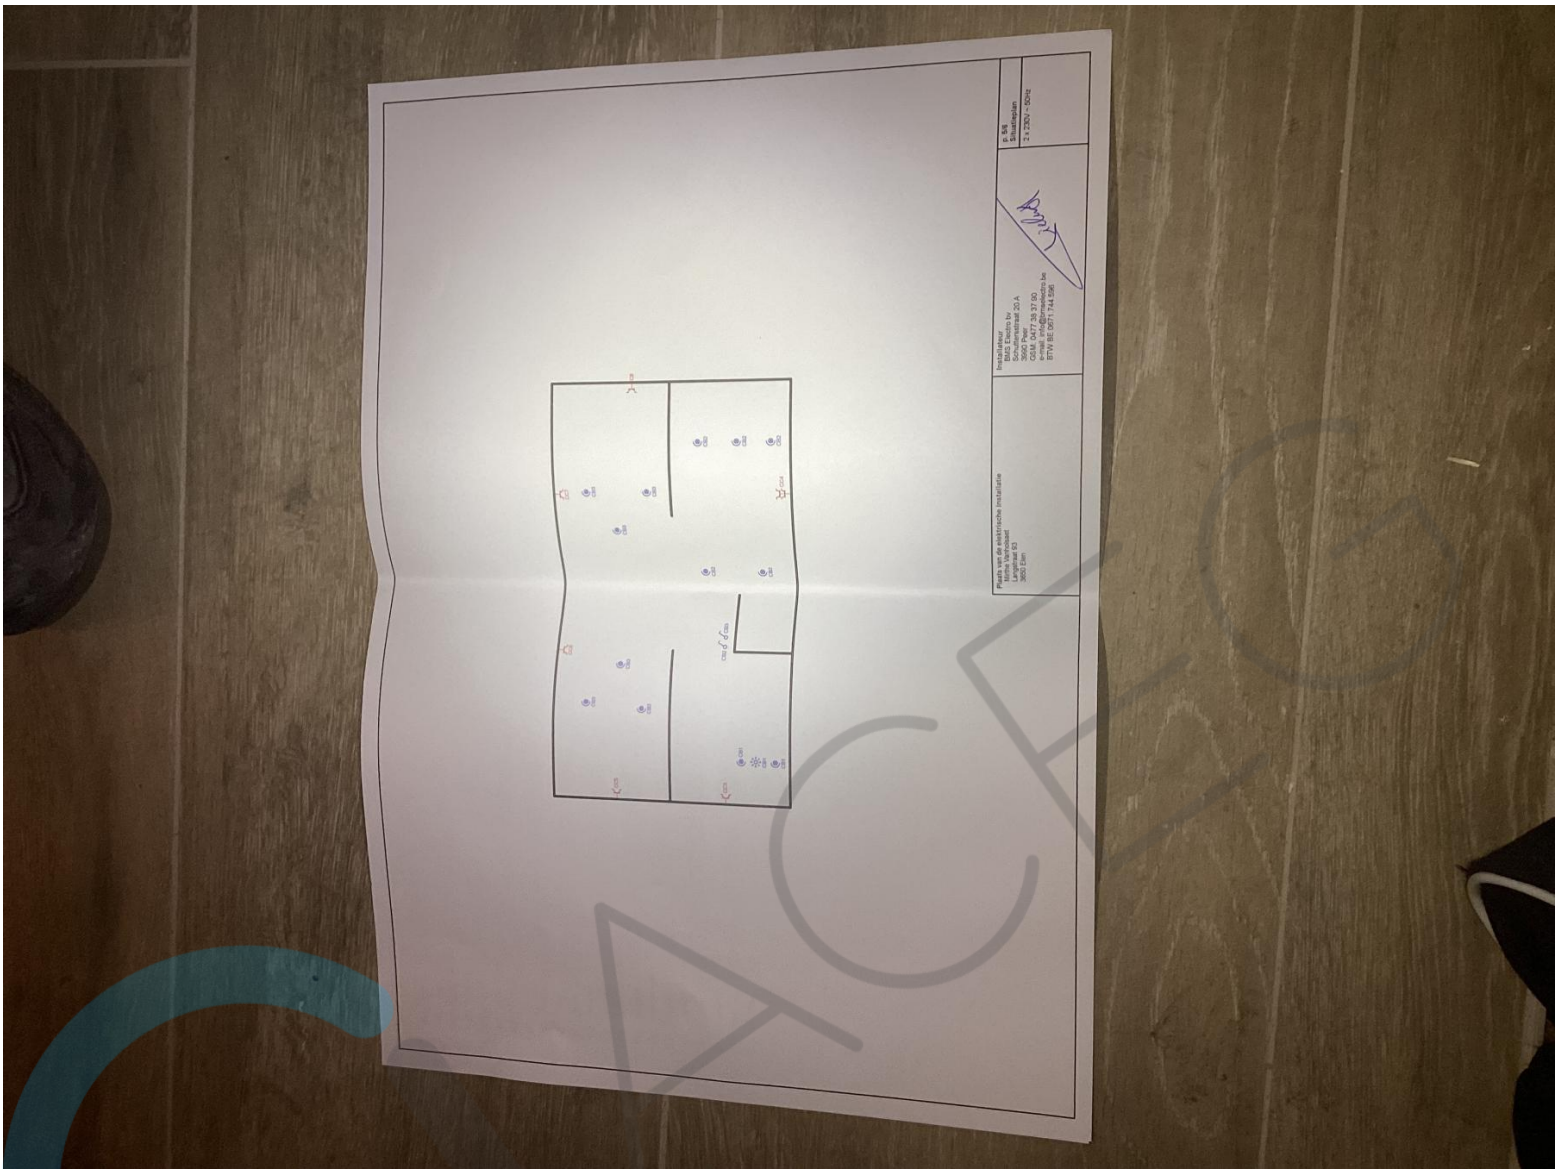

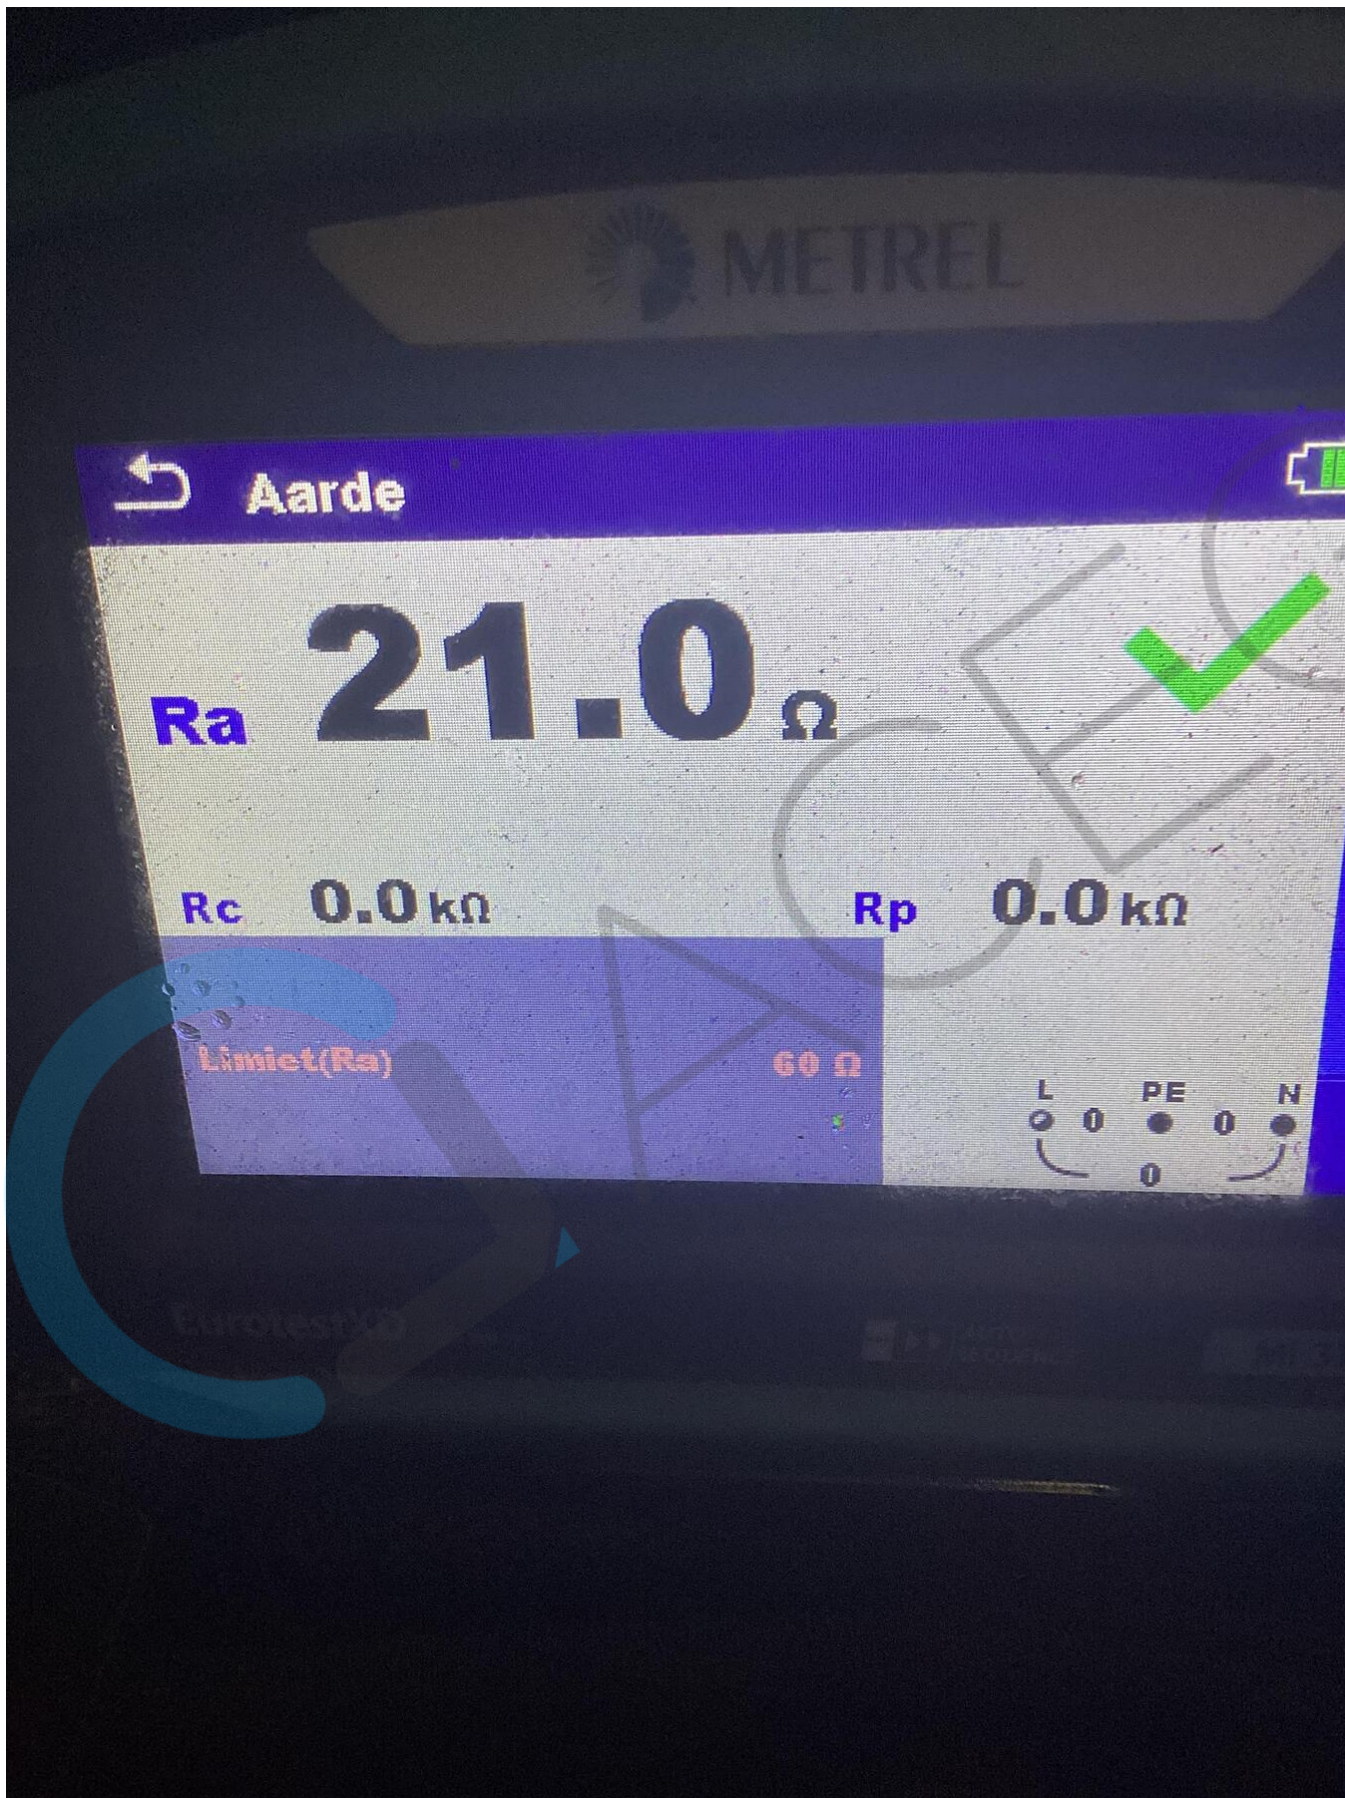



A Rood 2
 BA Rood 3P
 BB Kautsen-Kautsen
 BC Verbinding
 BD Verbinding
 BE Lining + Bureau
 BF Kautsen
 BG CV
 BH Kautsen algemeen
 BI Lining
 B Rood 3
 CA Reserve
 CB Verbinding
 CC Berging boven + zolder
 CD Verbinding
 CE Badkamer
 CF Badkamer
 CG Wasmachine
 CH Drogkast
 CI Stappelaar
 C Kautsen
 D Verbinding

Plaats van de elektrische installatie
 Rente Verbinding
 Lengte 10
 3000 Een

Installateur
 Rente Verbinding 20 A
 3000 Een
 GBAK 1477 30 37 80
 e-mail: info@reventelectra.be
 BTW BE 0871 744 500

Leibert

2 R
 Lijst Krijgen
 7 x 230V - 50Hz

17/04/2025
